

BODYFRIEND BEYOND · MEMBERSHIP METAVERSE

바디프랜드 멤버십 메타버스

바디프랜드 비욘드

첫 2개월 — 계약 ① 구현 범위 제안

2026년 7월에 착수하면, 연내 베타 서비스가 가능합니다.

이 문서는 계약 ①(첫 2개월)의 구현 범위와 수행 방식을 정리한 것입니다.

제안 리체 · 바디프랜드 전용 프로젝트 · 대외비

— 01 · 이 문서의 위치

지난 발표는 전체 구상이었고, 이 문서는 계약 ①의 실행 범위입니다.

비온드의 세계관·4개 층·등급·코인 3단계는 7월 16일 발표로 같음하며, 이 문서에서 다시 설명하지 않습니다. 다루는 주제는 하나입니다 — 계약 ①에서 무엇을, 어디까지 구현해 보여드리는가.

지난 발표 (Draft 1)

비온드의 전체 구상 — 멤버십 메타버스의 세계관, 4개 층과 등급, 5개월 · 독립 계약 3건.

이 문서 (Draft 2)

그중 계약 ① 하나 — 2개월의 구현 범위, 수행 방식, 그리고 그 방식을 택한 근거.

오늘 요청드리는 결정

계약 ① 승인(2개월)과 NDA — 두 가지입니다. 계약 ②·③은 2개월의 결과 위에서 논의합니다.

결정 범위는 두 달, 하나의 계약으로 한정하고, 그 안에서 동작하는 결과물로 증명합니다.

— 02 · 2개월의 목표

보고서가 아니라, 실제로 동작하는 핵심 경험을 만듭니다.

게임업계는 대작을 개발할 때 전체를 만들기 전에 수직 슬라이스(Vertical Slice)를 먼저 구현합니다 — 가장 얇게, 그러나 처음부터 끝까지 하나의 완결된 흐름으로. 계약 ①은 비온드의 수직 슬라이스입니다.

1 동작하는 내 몸 리포트

기획서가 아니라 화면 — 실데이터로 동작하는 시연을 기기에서 직접 확인하십니다.

2 숫자로 확인한 검증

앱·기기 데이터 실측으로 리포트 성립 범위와 공식 모수를 숫자로 확정합니다.

3 다음 계약의 판단 자료


혜택 마스터플랜 · KPI 확정안 · 투입 규모 산출 · 역할 분담안 — 계약 ②를 판단할 자료 일체.

2개월 뒤 남는 것은 인상이 아니라 실측 데이터와 동작하는 결과물입니다.

03 · 구현 범위 — 세 개의 트랙

두 달, 세 트랙이 병행됩니다.

검증·구현·설계는 순차가 아니라 겹쳐 진행됩니다. 검증(A)이 구현(B)의 입력을 대고, 구현이 설계(C)의 근거가 됩니다.

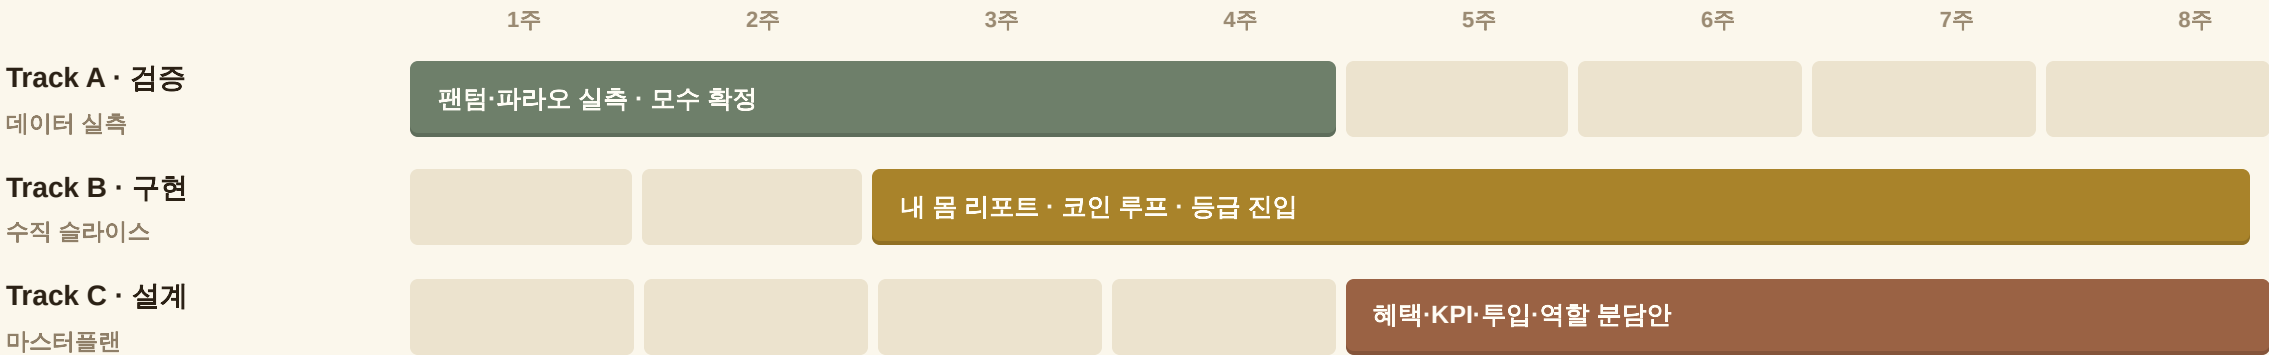

A · 검증

팬텀·파라오 중심 기기·앱 데이터 실측 → 연동
가능 모수·데이터 품질·리포트 성립 범위 판정, KPI
분모 확정.

B · 구현

내 몸 리포트·코인 루프·등급 진입을 하나의 동작하는
흐름으로 구현 — 다음 장에서 화면 단위로 상술.

C · 설계

등급×혜택 매트릭스, 셀렉트 운영 설계(멤버십 혜택
구성에 로마드 연계 포함), KPI 확정안, 투입 규모 산출,
역할 분담안.

— 03 · 구현 범위 — 수직 슬라이스의 내용물

하나의 완결된 사용자 경험을, 처음부터 끝까지 구현합니다.

전 기능이 아니라 하나의 완결된 흐름입니다 — 켜고, 확인하고, 몸을 돌보고, 쌓이고, 오르는 과정. 실데이터 구간과 샘플 구간을 구분해 표기합니다.

내 몸 리포트

동작 · 실데이터

지난주의 몸 변화 그래프, 케어 기록, 내 데이터에서 산출한 오늘의 미션과 보상.

코인 루프

동작 · 실데이터

케어 기록 → 적립 → 등급 게이지 상승 — 리텐션 루프의 최소 완결 단위.

등급 진입

동작 · 샘플 데이터

게스트 QR 가입 → 럭키드로우 → 프렌드·라운지 진입 — 사다리의 첫 세 칸.

가족 공유

동작 · 샘플 데이터

제품 고객의 주간 리포트가 가족 계정으로 확장되는 흐름의 시연.

웰니스 셀렉트 미리보기

화면 · 콘셉트

라운지 등급에 열리는 장터의 콘셉트 화면입니다. 거래 기능은 이번 범위가 아니므로 화면으로만 제시하며, 실데이터·샘플·콘셉트의 경계를 명확히 표기하는 것이 검증의 전제입니다.

— 03 · 구현 범위 — 이번 계약에 포함되지 않는 것

계약 ①의 범위 밖 — 아래 네 가지는 포함하지 않습니다.

범위를 먼저 명확히 하는 것이 2개월의 일정과 비용을 확정하는 전제입니다. 아래 네 가지는 계약 ①에 포함되지 않습니다.

기존 앱의 리뉴얼·운영

내부팀의 영역이며 이미 성과를 내고 있습니다. 리체는 그 위에 얹는 **새로운 층**만 만듭니다 — 중복 투자도, 영역 충돌도 없습니다.

코인 2·3단계 (크레딧 경제·시장 개방)

앞단이 성립하기 전의 뒷단 설계는 실익이 없습니다. 5개월 판정 뒤 별도 승인 대상입니다.

소사이어티 거래 보증 구조

인증·보증·평판·퇴출의 책임 구조는 무거운 결정이므로, 검증된 숫자 위에서 별도로 승인받겠습니다.

전면 개발 · 전 고객 오픈

수직 슬라이스와 베타 설계까지가 이번 범위입니다. 확산은 판정을 통과한 다음 단계의 일입니다.

범위를 한정함으로써 **2개월 내 확정적 결과와 명확한 판정 기준**을 확보합니다.

— 04 · 리체 단독 수행의 근거 — 첫째, 목표의 순도

검증 결과가 판단 재료가 되려면, 목표가 **그대로 구현**되어야 합니다.

목표가 변형되지 않아야 합니다

실행 주체가 섞이면 목표는 회의마다 조율의 대상이 되고, 두 달 뒤 **무엇을 판정하는지가 모호해집니다**. 의장님의 구상이 원안대로 구현되어야, 판정도 원안에 대해 내려집니다.

책임 소재가 단일해야 합니다

리체가 전담하므로 결과가 부족하면 **원인이 명확합니다**. 책임이 나뉘는 구조에서는 성과의 원인을 특정할 수 없어 판정 자체가 어려워집니다 — 리체는 판정받는 쪽을 택했습니다.

바디프랜드 내부 자원은 본업에 집중합니다

검증 2개월 동안 바디프랜드는 **별도 인력 투입 없이 기존 사업에 집중**한 채, 두 달 뒤 결과를 보고 다음 방향을 결정하시면 됩니다. 실행은 리체가, 결정은 바디프랜드가 맡는 구조입니다.

— 04 · 리체 단독 수행의 근거 — 둘째, 개발·유지보수 효율

리체는 이번 구현을 100% AI 네이티브로 개발합니다.

이는 개발 속도의 문제이자, 이후 수년간의 운영·유지보수 비용 구조의 문제입니다.

속도

소수 정예 × AI 개발로 **2개월**이라는 기간이
성립합니다. 통상 이 규모 구축의 10% 수준 비용도 이
방식이라야 가능한 숫자입니다.

유지보수의 경제

계절·캠페인마다 콘텐츠와 화면을 개발자 손을 거의
거치지 않고 갱신합니다 — **업데이트가 빠르고 저렴한**
구조가 살아있는 멤버십의 전제입니다.

단일 코드베이스

AI 유지보수 효율은 **하나의 일관된 코드베이스**에서
극대화됩니다. 검증 단계에서 이질적 코드가 섞이면 이
이점이 시작부터 사라집니다.

기존 앱·시스템과의 결합은 배제가 아니라 순서의 문제입니다 — **검증 결과 위에서, 역할 분담안과 함께 설계해 제출합니다.**

— 05 · 두 달 뒤의 결정

이후 개발 방식은, 두 달 뒤 **결과를 보고 함께** 정합니다.

단독 수행은 두 달의 약속이며, 이후는 열려 있습니다. 판단 재료(슬라이스 완성도·검증 데이터·KPI·역할 분담안)를 놓고, 세 갈래에서 함께 선택하시면 됩니다.

하이브리드 개발

바디프랜드 내부팀과 리체가 **역할 분담안에 따라 함께**
— 어디를 누가 맡는 것이 가장 빠르고 경제적인지,
데이터가 답한 대로.

리체 전담 지속

속도와 단일 코드베이스의 이점이 크다고 판정되면 —
전담 구조를 다음 단계로 연장합니다.


중단

성과가 기준에 미달하면 — **다음 계약은
없습니다.** 확산의 위험을 바디프랜드가 먼저 지지
않는 구조입니다.

리체는 결과에 따르겠습니다 — 다만 **판단의 재료만은 변형 없이** 만들어 제출하겠습니다.

— 06 · 8주 진행 · 보고 체계

진행 상황은 2주 단위로 서면 보고합니다.

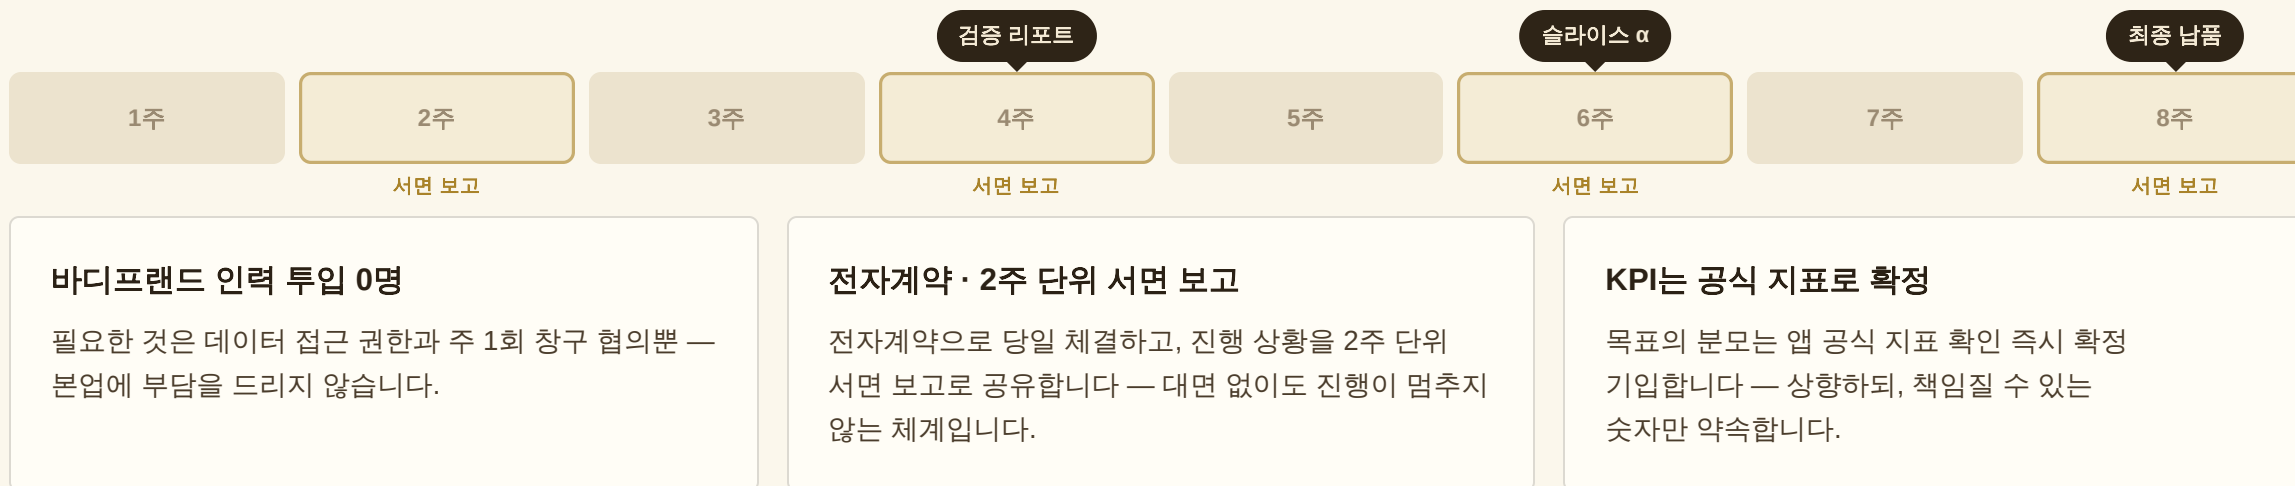

7월 착수 → 9월 검증 완료 → 연내 베타 — 연내 베타 서비스의 착수 시한이 2026년 7월입니다.

— 07 · 요청드리는 결정

필요한 결정은 두 가지 — 모두 **오늘 가능한** 결정입니다.

1 계약 ① 승인 — 1.99억 원 · 2개월

계약 금액은 **체결 시 전액 지급** 조건입니다 — 정산이 아니라 실행에 두 달을 온전히 쓰겠습니다. 위험은 구조로 통제합니다: **납품물 전체의 검수 의무**를 계약서에 명시하며, 성과 기준에 미달하면 다음 계약은 없습니다. 전자계약으로 당일 체결이 가능합니다.

2 NDA 체결 — 빠른 착수를 위해

데이터 제공 범위·고객 동의 체계를 담은 비밀유지계약입니다. 리체의 전용성 약정을 함께 담습니다 — 본 프로젝트의 결과물과 노하우는 바디프랜드 외 어떤 회사에도 제공하지 않습니다.

오늘 승인 범위

계약 ① + NDA — 계약 ②·③, 코인 뒷단, 소사이어티 보증은 검증 결과 위에서 별도 승인

데이터 활용

고객 동의와 관련 법령의 범위 안에서 설계 — 고객 동의 체계 설계가 계약 ①의 첫 과업

비온드의 전체 구상은 계약 ②·③에서 이어집니다.

다만 연내 베타 서비스가 가능하려면,
착수 시한은 **2026년 7월**입니다.

계약 ①과 NDA를 승인해 주시면, 리체는 즉시 데이터 실측에 착수합니다.

LICHE · 바디프랜드 멤버십 메타버스 · 바디프랜드 전용 프로젝트 · 대외비
